

CENABAST

VBC/mec.-

UNIDAD DE ASESORÍA
PRESUPUESTARIA

18 JUL. 2018

SENADO

3997 /

ORD. N°

ANT.: Glosa 05 y 06 de la Ley de Presupuesto de Cenabast año 2018.

MAT.: Informe trimestral a junio de 2018 de las glosas N° 05 y 06: "Estado de Avance del Plan de Modernización de Cenabast" y "Deuda a Proveedores con más de Treinta días de Facturación a junio de 2018".

SANTIAGO, 17 JUL 2018

PARA : COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
SENADO DE LA REPUBLICA DE CHILE

DE : CHRISTIAN VENEGAS TUDELA
DIRECTOR (S) CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S.

En cumplimiento a lo dispuesto en las glosas N° 05 y 06 de la Ley de Presupuestos del año 2018 de Cenabast, adjunto remito a ustedes, estado de avance del Plan de Modernización de Cenabast y detalle de la deuda con proveedores con más de treinta días de facturación a junio de 2018.

Saluda atentamente,


CHRISTIAN VENEGAS TUDELA
DIRECTOR (S)
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S.

DISTRIBUCION:

- Jefe de Presupuesto Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Dirección de Presupuestos - Ministerio de Hacienda
- Depto. Administración y Finanzas Cenabast
- Of. de Partes Cenabast
- Archivo Cenabast

SENADO DE LA
REPUBLICA DE CHILE

17 JUL 2018

CORREO INTERNO

**PLAN DE MODERNIZACIÓN CENABAST
PERIODO 2018**

**Segundo Informe de Avance
Junio 2018**

1.- INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto, dar cuenta de los estados de avance del proyecto SVYT, comprometido dentro del plan de modernización de CENABAST a junio de 2018.

Los objetivos del sistema SVYT son los siguientes:

- Generar un sistema en ambiente web que permita visualizar y contar con trazabilidad de los pedidos emitidos por CENABAST para distribución del proveedor, y que son considerados en el “Informe de Distribución Mensual”, desde el momento en que el Proveedor de CENABAST efectúa la carga de información y despacho de productos, hasta que el pedido es entregado al respectivo Establecimiento de Salud (Cliente de CENABAST).
- Conocer que productos y en qué cantidades, fueron despachados por el proveedor de CENABAST.
- Conocer los documentos tributarios asociados a los despachos.
- Mantener la información de cuando fueron despachados los productos por el proveedor y a cuantos bultos equivale el pedido despachado por el proveedor CENABAST, además de conocer su fecha de recepción por el cliente CENABAST.

Asimismo por parte del cliente se implementarán las siguientes factibilidades.

- Podrá efectuar seguimiento de sus pedidos a través del Documento de Venta (Trazabilidad) en la página web proporcionada por el Operador Logístico.
- Mantendrá la información de los pedidos y productos que son despachados hacia su bodega (Visibilidad)
- Dispondrá con copias digitales de los recibibles recibidos conforme, renombrados con el número de pedido denominado “Documento de Venta”.

2.- PROYECTO SVYT PERIODO 2018

Sub-Área TI	Nombre Proyecto	Fecha de Implementación	Descripción
Desarrollo Interno	Implementación Sistema de Visibilidad y Trazabilidad “SVYT”.	Anual Periodo 2018 (Salida en Productivo)	Implementación y puesta en marcha de SVYT.

Tabla 1: Resumen de antecedentes generales del proyecto.

2.1 IMPLEMENTACIÓN DE SVYT.

El sistema SVYT será provisto por CENABAST, para ser utilizado por proveedores y operadores logísticos (OL) que cuenten con contratos vigentes con CENABAST, proporcionará la siguiente información de utilidad:

- Entrega de información oportuna y precisa de los pedidos efectivamente despachados a los clientes de CENABAST.
- Integración con los sistemas informáticos de los operadores logísticos, con el objeto de contar con trazabilidad on-line de los despachos efectuados.
- Utilización de estándares de codificación GS1, con el objeto de contar con trazabilidad de los bultos despachados (cantidad de producto, lote, fecha vencimiento).
- Integración con los sistemas de los operadores logísticos, con objeto de obtener los cedibles recibidos conforme, renombrados con número de pedido denominado "Documento de Venta".
- Utilizar la información para contrastar la distribución real efectuada desde bodega Proveedor con el Informe de Distribución mensual.
- Generación de Reportes.

La siguiente imagen ilustra en términos generales el proceso de operación de SVYT.

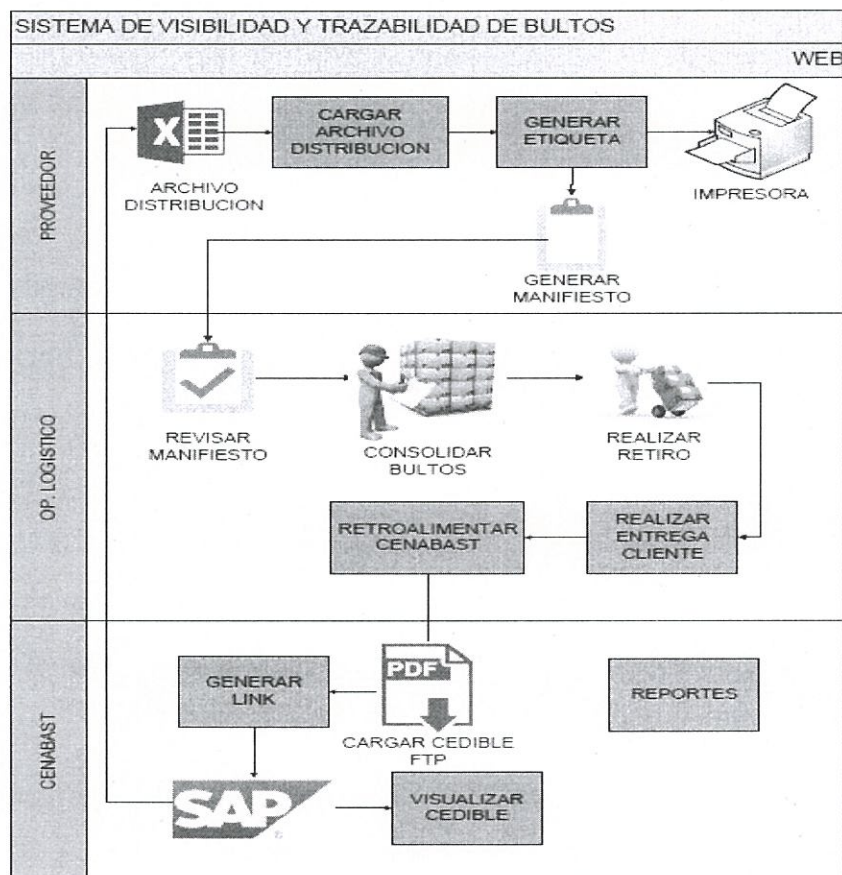


Figura 2: Diagrama de proceso de operación de SVYT.

2.2 FUNCIONALIDADES DE SVYT.

Dentro de las principales funcionalidades que se encuentran consideradas en este proyecto de implementación de WMS, se indican las siguientes 10:

1	Carga de datos (individual o masiva)
2	Generación de etiquetas: Con información de destino, bulto, producto, documentación, código en formato GS1 y código de cada operador logístico contratado por CENABAST.
3	Enviar Información automática al sistema del operador logístico.
4	Enviar datos y actualizar el ERP SAP de CENABAST, con información de la operación.
5	Debe informar vía reporte de Manifiesto a los clientes de CENABAST, una vez retirados por OL.
6	Rescatar Información automática del sistema del o los operadores logísticos (Cedibles).

Tabla 2: Funcionalidades SVYT.

3.- PLAZOS PLAN DE MODERNIZACIÓN AÑO 2018 Y ESTADO DE AVANCE

EL estado de avance actual del proyecto corresponde a un 82% del total, según carta Gantt informada previamente a Junio del presente año.

Act	Proceso de Desarrollo	Estado	% Valor	% Avance	Inicio	Termino
Año 2017						
1	Sistema de Carga	Completado	3	100%	26-09-2017	07-10-2017
2	Tabla Auxiliar (SSCC)	Completado	3	100%	02-10-2017	05-10-2017
3	Generacion de Etiqueta en Formato GS1	Completado	3	100%	09-10-2017	19-10-2017
4	Simbolo superior (asociado a prodcuto)	Completado	3	100%	20-10-2017	31-10-2017
5	Simbolo Inferior (asociado al despacho)	Completado	3	100%	02-11-2017	17-11-2017
6	Manifiesto de entrega de bultos	Completado	10	100%	20-11-2017	01-12-2017
7	Ciclo de Pruebas Fase 1	Completado	3	100%	04-12-2017	11-12-2017
8	Envio de informacion a OL	Completado	3	100%	12-12-2017	19-12-2017
9	Lectura de Informacion	Completado	5	100%	20-12-2017	30-12-2017
Año 2018						
10	Instalación Servidor PRD	Completado	4	100%	10-01-2018	20-01-2018
11	Retroalimentacion de informacion TNT - CNB	Completado	5	100%	10-01-2018	26-01-2018
12	Lectura Informacion enviada por OL	Completado	5	100%	29-01-2018	09-02-2018
13	Ciclo de Pruebas Fase 2	Completado	5	100%	05-03-2018	16-03-2018
14	Packing List	Completado	5	100%	19-03-2018	30-03-2018
15	Rescate de Cedibles	Pendiente	5	100%	03-04-2018	21-04-2018
16	Reportabilidad	Pendiente	5	100%	24-03-2018	31-05-2018
17	Ciclo de Pruebas Fase 3	Pendiente	5	100%	01-05-2018	31-05-2018
18	Implementacion y Ajustes	Pendiente	20	30%	04-06-2018	31-08-2018
	Prueba proveedores (5)					
	Reunion revision					
	Prueba proveedores (25)					
	Reunion revision					
	Prueba proveedores (75)					
	Reunion revision					
	Prueba proveedores (125)					
	Reunion revision					
	Soporte					
19	Entrega	Pendiente	5	0%	03-09-2018	07-09-2018
	Entrega Final					

Avance Total	82%
---------------------	------------

DEUDA CON PROVEEDORES CON MÁS DE TREINTA DÍAS A JUNIO DE 2018

En pesos

Deuda	Días						Total	
	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180		>181
Total	5.064.422.210	8.909.397.740	10.678.035.763	6.897.048.571	6.076.098.601	3.852.285.659	9.015.995.974	50.493.284.518
